









Propuesta · Brand + Website

Una marca y una web, construidas en paralelo









Refinar lo que existe. Construir un sistema.

Para una empresa industrial B2B que quiere evolucionar su marca y llevarla a una web que presente su oferta y convierta en solicitudes de cotización.

(001) Enfoque

(002) Objetivos

(003) Entregables

(004) Releases

(005) Calendario

(006) Cómo trabajaremos

(007) Portfolio

(008) Condiciones

(009) Inversión

(001)

Cómo lo planteamos

Hay una estrategia y un camino visual elegido. El trabajo es cerrarlo con criterio y llevarlo a la web sin perder tiempo.

Inversión
7.950 € + IVA
Precio cerrado

Brand
11 dic
Sistema completo

Release 1
11 ene
Clientes y prospectos

Release 2
Fin feb
A acordar con el cliente

Partir de lo que existe

Las rutas visuales trabajan sobre el camino elegido, con foco tipográfico y **criterios acordados al inicio**, para decidir con argumentos de negocio y no por gusto.

Dos releases

Primero lo comercial para clientes y prospectos, el 11 de enero. Después el resto de audiencias y contenidos, a finales de febrero.

Marca y web en paralelo

Con logo, tipografía y color aprobados arranca la web, que se convierte en **el banco de pruebas de la marca**: ver el sistema en páginas reales dice pronto qué funciona.

En mancuerna

Una célula de proyecto con dirección, marca y web. El copy se **cocrea**: se diseña con contenido real, nunca con lorem ipsum.

(002)

Objetivos

Punto de partida. Se confirman en la sesión de arranque.

La marca	Evolucionar sin perder lo construido y quedar como un sistema coherente, documentado y listo para usar por el equipo y sus proveedores.
El proyecto	Llegar a los tres hitos con decisiones explicadas desde la estrategia y sin bloqueos entre frentes.
La web	Presentar la oferta con claridad, orientar a cada audiencia y convertir visitas en solicitudes de cotización, con un equipo autónomo para actualizarla.

(003)

Qué se entrega

Cada pieza con su volumen y formato.

01

Rutas visuales

3 rutas · 2 rondas

Tres rutas sobre el camino elegido, con foco tipográfico y el razonamiento de cada una frente a los criterios del brief.

Una dirección conceptual nueva tras elegir ruta supone revisar el alcance.

02

Logo y arquitectura

Principal, secundaria y símbolo

Composiciones, jerarquías, proporciones, área de protección, tamaños mínimos y usos sobre distintos fondos. Incluye la documentación técnica de construcción: retícula, curvas y geometría.

SVG, PNG, PDF y EPS.

03

Estilo tipográfico

Familias, pesos y jerarquías

Reglas de uso para aplicaciones y web.

Se identifican las licencias necesarias; su coste va aparte.

04

Iconografía

24 iconos base

Estilo, colección base y reglas para ampliar el sistema.

SVG.

05

Sistema de color

HEX · RGB · CMYK

Paleta principal y secundaria, combinaciones y criterios de contraste para digital e impreso.

06

Elementos gráficos

Editables

Formas, patrones y recursos con reglas de composición.

Brand · continuación

07

Estilo de foto y vídeo

Dirección visual

Referencias, encuadres, ritmo, tratamiento de color y criterios de selección y producción.

La producción de foto y vídeo se presupuesta aparte.

08

Aplicaciones listas para usar

Firma de email · LinkedIn

Firma de email implementable y probada en los principales gestores de correo. Portada y foto de perfil de LinkedIn adaptadas a sus formatos.

Incluye una ronda adicional de ajustes en la firma tras su implantación.

09

Mockups de aplicación

6 escenas sectoriales

Representaciones de la identidad aplicada a contextos propios de la industria del cliente, como embalaje de transporte o señalética de planta. Se seleccionan en el arranque.

Los mockups muestran el comportamiento de la marca y no constituyen diseños de producción. Piezas como una línea textil, papelería o publicaciones editoriales requieren un proceso de diseño específico y se presupuestan aparte.

10

Plantilla de presentación

PowerPoint · estructura + ejemplos

Portada, contraportada, separadores y páginas internas, más diapositivas de ejemplo con contenido real: gráficos, tablas y datos. Las tipologías de contenido se definen conjuntamente con el equipo de dirección.

Se apoya en IA para generar variantes de ejemplo a partir de los fundamentos de la marca. Compatible con Google Slides y Keynote.

11

Brandbook interactivo

Brand site + PDF · más de 40 páginas

Manual completo que documenta el sistema: logotipo y variantes, construcción técnica, tipografía, color, elementos gráficos, fotografía y aplicaciones. Guías navegables y descarga de recursos, además de la versión en PDF.

Incluye diseño, construcción y configuración. El plan de la plataforma es un coste recurrente del cliente.

12

Librería final

Nomenclatura + traspaso

Editables y exportaciones organizados: logotipos, colores, tipografías y licencias.

Sesión de traspaso de una hora con el equipo.

Website

01

Arquitectura y UX/UI

~12 plantillas · 3 tamaños

Revisión de la arquitectura y los contenidos actuales con el cliente: qué se mantiene, qué se modifica y qué se incorpora. Mapa del sitio, recorridos por audiencia y reparto entre releases. Exploración visual, wireframes y plantillas en escritorio, tablet y móvil.

Componentes en Figma.

02

Sistema de plantillas

Plantillas con variantes

Cada tipo de página se diseña como una plantilla modular con variantes de fondo, color y composición de módulos. Así cada página tiene identidad propia sin multiplicar diseños.

El alcance se mide en plantillas únicas, no en número de páginas.

03

Copy cocreado

Con el equipo de dirección

Dirección lidera narrativa y mensajes; Olaia aporta arquitectura de contenidos, titulares, microcopy y ajuste al diseño.

Sin lorem ipsum: se diseña con contenido real.

04

Implementación y CMS

Framer

Colecciones del CMS (oferta, fichas y blog), carga inicial acordada, acceso y formación.

05

Formularios y CRM

Contacto + Request a Quote

Campos, adjuntos, validaciones, confirmaciones, destino, asignación y seguimiento. Flujo probado de principio a fin.

Integración directa o vía Make/Zapier según el CRM; suscripciones aparte.

06

Pruebas y publicación

HTTPS en su dominio

Navegación, formularios, responsive, accesibilidad básica, rendimiento, SEO técnico básico y medición. Coordinación de DNS y hosting.

07

Plataforma

Framer recomendado

Publica rápido, tiene un CMS comprensible para el equipo y es muy fiel a la marca.

El límite del CMS depende del plan y los formularios llegan al CRM por integración.

08

Entrega y continuidad

30 días por release

Accesos, documentación, guía de uso y formación, con corrección de incidencias tras cada release.

Mantenimiento posterior opcional, como bolsa de horas.

(004)

Qué entra en cada release

Mapa inicial a partir del brief, con margen holgado. La distribución final se cierra con el cliente en la fase de arquitectura.



Una plantilla se diseña una vez y sirve para todas sus páginas, con variantes de fondo, color y módulos que aportan dinamismo. Una ficha multinivel o un artículo del blog cuentan como una sola plantilla. El número de páginas es orientativo; el alcance se mide en plantillas únicas.

Detalle por release

Release 1

11 ene · clientes y prospectos

Home	Presenta la empresa y orienta a cada audiencia.
About Us	Página principal.
Oferta	Portada y unas 4 páginas de detalle.
Contacto y Request a Quote	Conectados al CRM, con el flujo probado.
Navegación y footer	Accesos rápidos, mapa, certificaciones, redes y legales.

Release 2

fin feb · resto de audiencias

Ajustes de la R1	Cambios a partir del uso real y el feedback.
About · subsecciones	Historia, compromiso, instalaciones y ubicaciones.
Páginas independientes	Entre 6 y 8, con vídeo, certificaciones y descargables.
Contenido multinivel	3–5 categorías con fichas, recursos y glosario.
Blog / News	Listado y detalle en el CMS, 3 publicaciones de ejemplo.

(005)

De noviembre a febrero

Arranque el 2 de noviembre. En Navidad solo se paran los festivos.



17 nov
Ruta visual elegida, tras presentarlas el 12.

27 nov
Logo, tipografía y color aprobados.

11 dic
Brand entregada.

11 ene
Release 1 publicada.

Fin feb
Release 2 publicada, fecha a acordar.

Diez hitos con dos rondas de revisión cada uno. Las fechas asumen que cada hito se valida en un plazo de 2–3 días hábiles, con feedback consolidado, y que el copy de cada release se entrega a tiempo. Si los plazos de validación se amplían, el calendario se reajusta de mutuo acuerdo.

(006)

Cómo trabajaremos

Un equipo pequeño y cercano, con marca y web avanzando a la vez sin pisarse.

Diseño de marca y web

Esamesa Studio

Dirección visual de marca y web, de las primeras rutas al desarrollo en Framer. Un solo punto de contacto para todo el diseño, que presenta cada hito.

Estrategia

Equipo de dirección

Refinamiento estratégico, prioridades, narrativa y copy, y relación con el cliente.

Marca	Rutas y logo	Sistema	Aplicaciones	Brandbook
Web	Arquitectura	Wireframes	Release 1	Release 2
Estrategia	Brief y criterios	Revisión	Copy R1	Copy R2

Sesión semanal

Planificación y revisión con todo el equipo, y avances compartidos entre medias para anticipar bloqueos.

Desde la estrategia

Cada decisión explica cómo responde a la marca, al negocio y a sus audiencias.

Idiomas y archivos

Coordinación en español; materiales para el cliente y web en inglés. Todo en Figma, con acceso desde el primer día.

Dos rondas por hito

Feedback reunido en un solo documento, en cada uno de los diez hitos.

IA con criterio

Para explorar y acelerar; los resultados se transforman en un lenguaje propio.

(007)

Sobre Olaia

Diseñadora senior de producto y marca, y cofundadora de Esamesa Studio.

Identidad, producto digital y web.

Especialidades

01 Product Design
02 B2B SaaS
03 UX/UI
04 Design Systems
05 Brand & Web
06 No-code
07 Flujos creativos con IA

Experiencia

Esamesa Studio — 2025 – hoy
Diseñadora de producto freelance y cofundadora

Mitimiti Studio — 2026 – hoy
Senior Product Designer

Capchase — 2021 – 2025
Senior Product Designer


Propelland — 2018 – 2021
Product Designer

Docencia — 2017 – 2019
Ironhack (UX/UI) y Creanavarra (Design Marketing)


Especialidades

Coca-Cola
Capchase
Indra
Baleària
TADIG
Colectin
TalentL
Jackrom
Vype
Emotionhack
EdgelQ
Xendra


Trabajo seleccionado

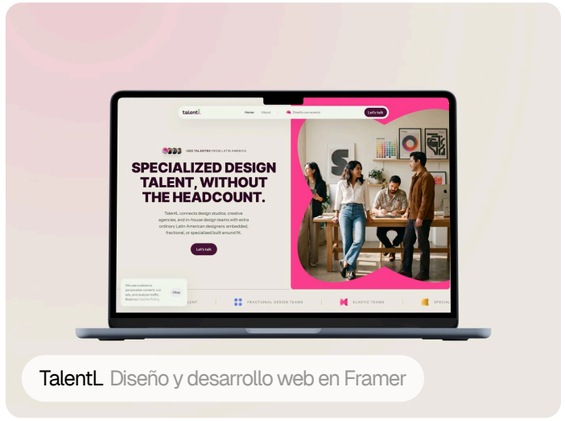

TalentL Diseño y desarrollo web en Framer

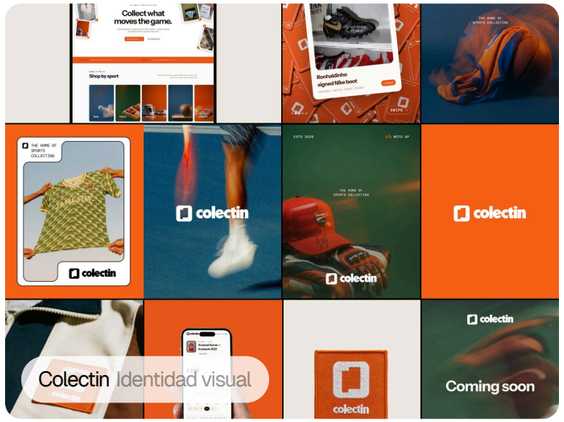


Colectin Identidad visual

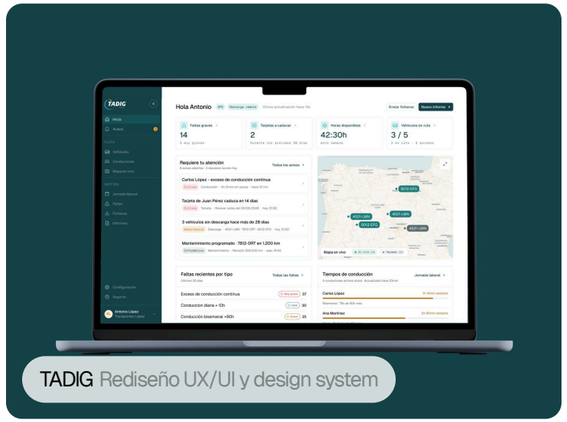


TADIG Rediseño UX/UI y design system



Baleària UX/UI de app

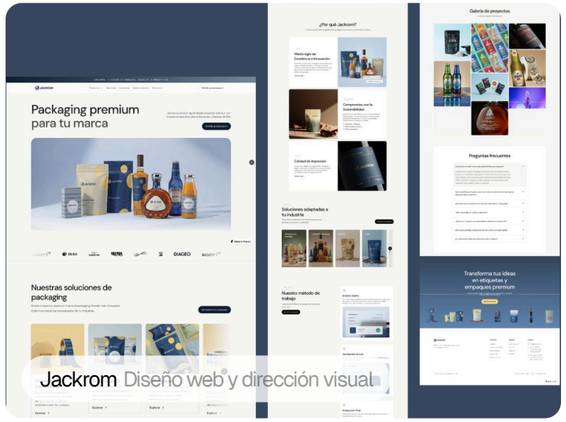


Jackrom Diseño web y dirección visual

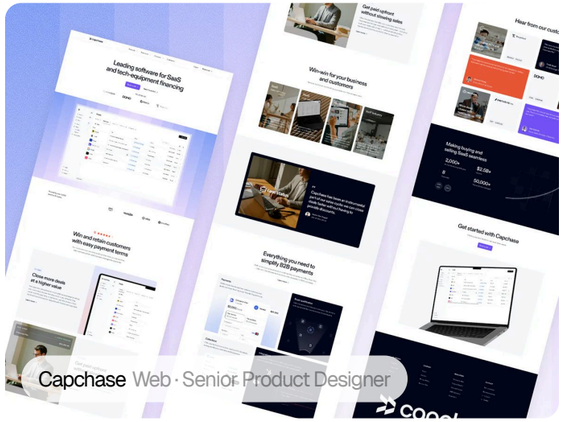

Capchase Web · Senior Product Designer



Coca-Cola App de personalización

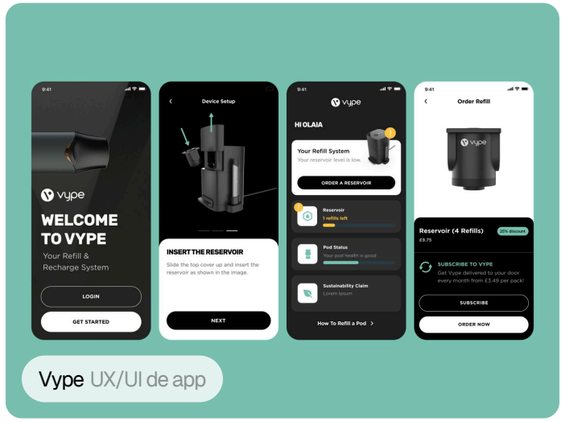

Vype UX/UI de app

(008)

Condiciones y siguientes pasos

Cualquier cambio de alcance se presupuesta y se acuerda antes de hacerlo.

Incluye

- Lo descrito en entregables y releases.
- Dos rondas en cada uno de los diez hitos.
- Copy cocreado con dirección.
- 30 días de incidencias tras cada release.
- Archivos finales y derechos de uso, al completar el pago.

Costes aparte

- Licencias tipográficas y bancos de imagen.
- Plan de Framer, dominio y hosting.
- CRM e integraciones de pago.
- Producción de foto y vídeo.
- Mantenimiento posterior, opcional.

Fuera de alcance

- Una dirección conceptual nueva tras elegir ruta.
- Plantillas únicas o piezas por encima de lo acordado.
- Diseño de producción de las piezas mostradas como mockup: textil, papelería o editorial.
- Versiones en otros idiomas.
- Carga más allá de la inicial acordada.

01

Revisión conjunta

Repasar la propuesta con dirección y ajustar alcance y releases.

02

Confirmación

Aprobación por email y factura de inicio.

03

Material de partida

Estrategia, exploraciones previas, CRM y accesos.

04

Arranque · 2 nov

Sesión para fijar criterios y prioridades.

(009)

Inversión

Precio cerrado por bloque para el alcance descrito. Importes en euros.

Inversión total

7.950 € + IVA

Brand Incluye el brandbook interactivo · 11 dic	3.320 €
Website · Release 1 Publicación el 11 de enero	2.940 €
Website · Release 2 Finales de febrero	1.690 €

Forma de pago

Cada bloque se factura una parte al inicio y otra a la entrega. El reparto exacto se acuerda según los bloques que se contraten.

Propuesta válida durante 30 días, hasta el 22 de noviembre de 2026.

Hablemos

olaiairigoien@gmail.com
