


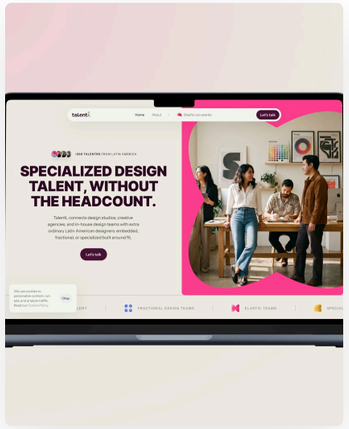


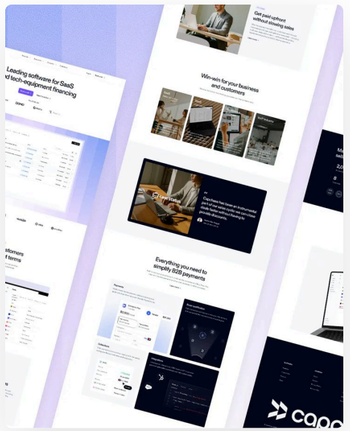



Propuesta · Brand + Website

Una marca y una web, construidas en paralelo

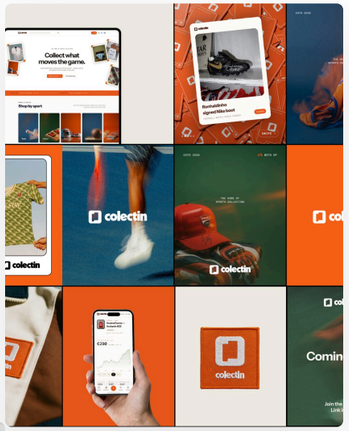

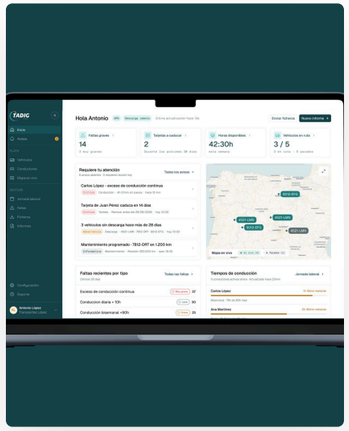

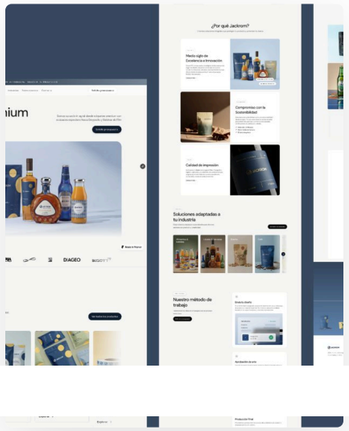



Evolucionar lo construido. Consolidar un sistema.

Propuesta de identidad visual y web para una empresa industrial B2B: una marca más sólida y coherente, y una web que presente su oferta con claridad y genere solicitudes de cotización.

(001) Enfoque

(002) Objetivos

(003) Entregables

(004) Releases

(005) Calendario

(006) Cómo trabajaremos

(007) Portfolio

(008) Condiciones

(009) Inversión

(001)

Cómo lo planteamos

El proyecto parte de una estrategia definida y de una dirección visual ya elegida. El objetivo es concretarla con criterio y trasladarla a la web de forma ágil.

Inversión
7.950 € + IVA
Precio cerrado

Brand
11 dic
Sistema completo

Release 1
11 ene
Clientes y prospectos

Release 2
Fin feb
Fecha a confirmar

Sobre lo que ya existe

Las rutas visuales se desarrollan sobre la dirección elegida, con especial atención a la tipografía y a partir de **criterios acordados en el arranque**. Así, cada decisión se toma con argumentos de negocio, no de gusto personal.

Dos releases

La primera, el 11 de enero, cubre el contenido comercial para clientes y prospectos. La segunda, a finales de febrero, incorpora el resto de audiencias y contenidos.

Marca y web en paralelo

Una vez aprobados logotipo, tipografía y color, comienza el diseño web, que actúa como **banco de pruebas de la marca**: aplicar el sistema a páginas reales permite validar pronto qué funciona.

Un equipo integrado

Estrategia, marca y web avanzan de forma coordinada. Los textos se **desarrollan conjuntamente** y el diseño se trabaja siempre con contenido real.

(002)

Objetivos

Objetivos de partida, que se validarán en la sesión de arranque.

La marca	Evolucionar sin perder el valor construido y consolidarse como un sistema coherente, documentado y fácil de aplicar por el equipo interno y sus proveedores.
El proyecto	Cumplir los tres hitos principales con decisiones fundamentadas en la estrategia y sin bloqueos entre marca y web.
La web	Presentar la oferta con claridad, guiar a cada audiencia y convertir visitas en solicitudes de cotización, con autonomía del equipo para mantenerla actualizada.

(003)

Qué se entrega

Cada entregable con su alcance y formato. Despliega cada uno para ver el detalle.

01

Rutas visuales

3 rutas · 2 rondas

Tres rutas sobre el camino elegido, con foco tipográfico y el razonamiento de cada una frente a los criterios del brief.

Una dirección conceptual nueva tras elegir ruta supone revisar el alcance.

02

Logo y arquitectura

Principal, secundaria y símbolo

Composiciones, jerarquías, proporciones, área de protección, tamaños mínimos y usos sobre distintos fondos. Incluye la documentación técnica de construcción: retícula, curvas y geometría.

SVG, PNG, PDF y EPS.

03

Estilo tipográfico

Familias, pesos y jerarquías

Reglas de uso para aplicaciones y web.

Se identifican las licencias necesarias; su coste va aparte.

04

Iconografía

24 iconos base

Estilo, colección base y reglas para ampliar el sistema.

SVG.

05

Sistema de color

HEX · RGB · CMYK

Paleta principal y secundaria, combinaciones y criterios de contraste para digital e impreso.

06

Elementos gráficos

Editables

Formas, patrones y recursos con reglas de composición.

Brand · continuación

07

Estilo de foto y vídeo

Dirección visual

Referencias, encuadres, ritmo, tratamiento de color y criterios de selección y producción.

La producción de foto y vídeo se presupuesta aparte.

08

Aplicaciones listas para usar

Firma de email · LinkedIn

Firma de email implementable y probada en los principales gestores de correo. Portada y foto de perfil de LinkedIn adaptadas a sus formatos.

Incluye una ronda adicional de ajustes en la firma tras su implantación.

09

Mockups de aplicación

6 escenas sectoriales

Representaciones de la identidad aplicada a contextos propios de la industria del cliente, como embalaje de transporte o señalética de planta. Se seleccionan en el arranque.

Los mockups muestran el comportamiento de la marca y no constituyen diseños de producción. Piezas como una línea textil, papelería o publicaciones editoriales requieren un proceso de diseño específico y se presupuestan aparte.

10

Plantilla de presentación

PowerPoint · estructura + ejemplos

Portada, contraportada, separadores y páginas internas, más diapositivas de ejemplo con contenido real: gráficos, tablas y datos. Las tipologías de contenido se definen conjuntamente con el equipo de dirección.

Se apoya en IA para generar variantes de ejemplo a partir de los fundamentos de la marca. Compatible con Google Slides y Keynote.

11

Brandbook interactivo

Brand site + PDF · más de 40 páginas

Manual completo que documenta el sistema: logotipo y variantes, construcción técnica, tipografía, color, elementos gráficos, fotografía y aplicaciones. Guías navegables y descarga de recursos, además de la versión en PDF.

Incluye diseño, construcción y configuración. El plan de la plataforma es un coste recurrente del cliente.

12

Librería final

Nomenclatura + traspaso

Editables y exportaciones organizados: logotipos, colores, tipografías y licencias.

Sesión de traspaso de una hora con el equipo.

Website

01

Arquitectura y UX/UI

~12 plantillas · 3 tamaños

Revisión de la arquitectura y los contenidos actuales con el cliente: qué se mantiene, qué se modifica y qué se incorpora. Mapa del sitio, recorridos por audiencia y reparto entre releases. Exploración visual, wireframes y plantillas en escritorio, tablet y móvil.

Componentes en Figma.

02

Sistema de plantillas

Plantillas con variantes

Cada tipo de página se diseña como una plantilla modular con variantes de fondo, color y composición de módulos. Así cada página tiene identidad propia sin multiplicar diseños.

El alcance se mide en plantillas únicas, no en número de páginas.

03

Textos y contenidos

Desarrollo conjunto con dirección

El equipo de dirección lidera la narrativa y los mensajes; desde diseño se aporta la arquitectura de contenidos, titulares, microcopy y su ajuste al diseño.

El diseño se trabaja siempre con contenido real.

04

Implementación y CMS

Framer

Colecciones del CMS (oferta, fichas y blog), carga inicial acordada, acceso y formación.

05

Formularios y CRM

Contacto + Request a Quote

Campos, adjuntos, validaciones, confirmaciones, destino, asignación y seguimiento. Flujo probado de principio a fin.

Integración directa o vía Make/Zapier según el CRM; suscripciones aparte.

06

Pruebas y publicación

HTTPS en su dominio

Navegación, formularios, responsive, accesibilidad básica, rendimiento, SEO técnico básico y medición. Coordinación de DNS y hosting.

07

Plataforma

Framer recomendado

Permite publicar con agilidad, ofrece un CMS sencillo para el equipo y garantiza una gran fidelidad a la marca.

El límite del CMS depende del plan y los formularios llegan al CRM por integración.

08

Entrega y continuidad

30 días por release

Accesos, documentación, guía de uso y formación, con corrección de incidencias tras cada release.

Mantenimiento posterior opcional, como bolsa de horas.

(004)

Qué entra en cada release

Mapa inicial elaborado a partir del brief, con margen suficiente. La distribución definitiva se cerrará con el cliente durante la fase de arquitectura.



Cada plantilla se diseña una vez y se aplica a todas las páginas de su tipo, con variantes de fondo, color y módulos que aportan variedad. Una ficha multinivel o un artículo del blog cuentan como una única plantilla. El número de páginas es orientativo: el alcance se mide en plantillas únicas.

Detalle por release

Release 1

11 ene · clientes y prospectos

Home	Presenta la empresa y orienta a cada audiencia.
About Us	Página principal.
Oferta	Portada y unas 4 páginas de detalle.
Contacto y Request a Quote	Conectados al CRM, con el flujo probado.
Navegación y footer	Accesos rápidos, mapa, certificaciones, redes y legales.

Release 2

fin feb · resto de audiencias

Ajustes de la R1	Cambios a partir del uso real y el feedback.
About · subsecciones	Historia, compromiso, instalaciones y ubicaciones.
Páginas independientes	Entre 6 y 8, con vídeo, certificaciones y descargables.
Contenido multinivel	3–5 categorías con fichas, recursos y glosario.
Blog / News	Listado y detalle en el CMS, 3 publicaciones de ejemplo.

De noviembre a febrero

Inicio el 2 de noviembre. En Navidad, el trabajo se detiene únicamente en los días festivos.



17 nov

Elección de la ruta visual, tras su presentación el día 12.

27 nov

Logo, tipografía y color aprobados.

11 dic

Brand entregada.

11 ene

Release 1 publicada.

Fin feb

Release 2 publicada, fecha a acordar.

Diez hitos con dos rondas de revisión cada uno. Las fechas asumen que cada hito se valida en un plazo de 2–3 días hábiles, con el feedback consolidado en un único documento, y que los textos de cada release se entregan según lo previsto. Si los plazos de validación se amplían, el calendario se reajustará de mutuo acuerdo.

(006)

Cómo trabajaremos

Un equipo reducido y cercano, con marca y web avanzando en paralelo de forma coordinada.

Diseño de marca y web

Esamesa Studio

Dirección visual de marca y web, desde las primeras rutas hasta el desarrollo en Framer. Un único interlocutor para todo el diseño, responsable de presentar cada hito.

Estrategia

Equipo de dirección

Estrategia, prioridades, narrativa y textos, y relación directa con el cliente.

Marca	Rutas y logo	Sistema	Aplicaciones	Brandbook
Web	Arquitectura	Wireframes	Release 1	Release 2
Estrategia	Brief y criterios	Revisión	Copy R1	Copy R2

Sesión semanal

Planificación y revisión con todo el equipo, con avances compartidos entre sesiones para anticipar posibles bloqueos.

Decisiones fundamentadas

Cada propuesta explica cómo responde a la marca, al negocio y a sus audiencias.

Idiomas y archivos

Coordinación en español; materiales de marca y web en inglés. Todo el trabajo en Figma, con acceso desde el primer día.

Dos rondas por hito

En cada uno de los diez hitos, con el feedback consolidado en un único documento.

Uso responsable de la IA

Como apoyo para explorar y agilizar procesos; los resultados siempre se trabajan hasta convertirlos en un lenguaje propio.

(007)

Sobre Olaia

Diseñadora senior de producto y marca, y cofundadora de Esamesa Studio.

Especialidades

01 Product Design
02 B2B SaaS
03 UX/UI
04 Design Systems
05 Brand & Web
06 No-code
07 Flujos creativos con IA

Identidad, producto digital y web. Pulsa sobre una imagen para ampliarla.

Experiencia

Esamesa Studio — 2025 – hoy
Diseñadora de producto freelance y cofundadora

Mitimiti Studio — 2026 – hoy
Senior Product Designer

Capchase — 2021 – 2025
Senior Product Designer


Propelland — 2018 – 2021
Product Designer

Docencia — 2017 – 2019
Ironhack (UX/UI) y Creanavarra (Design Marketing)


Especialidades

Coca-Cola
Capchase
Indra
Baleària
TADIG
Colectin
TalentL
Jackrom
Vype
Emotionhack
EdgeIQ
Xendra


Trabajo seleccionado

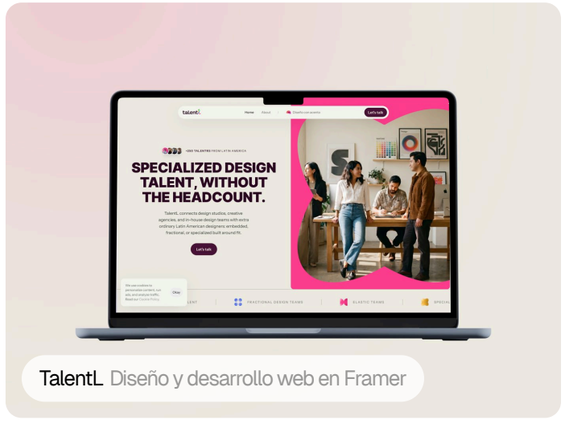

TalentL Diseño y desarrollo web en Framer

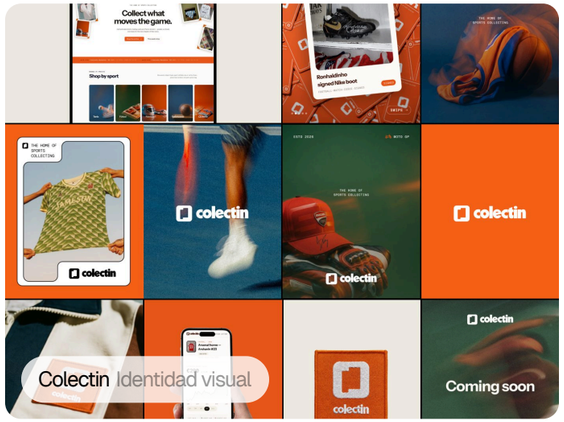


Colectin Identidad visual

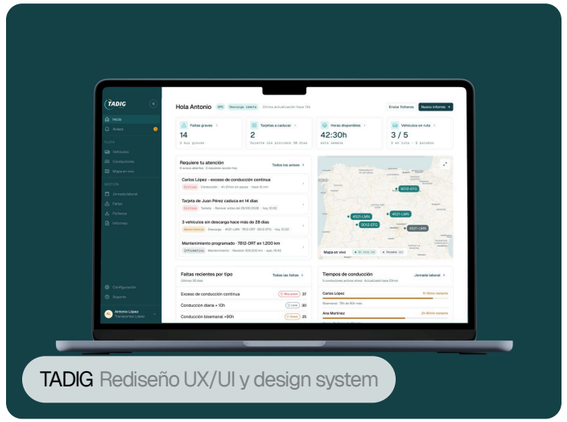


TADIG Rediseño UX/UI y design system



Baleària UX/UI de app

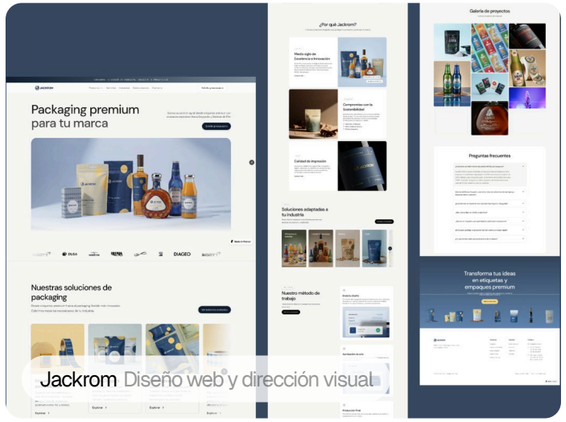


Jackrom Diseño web y dirección visual

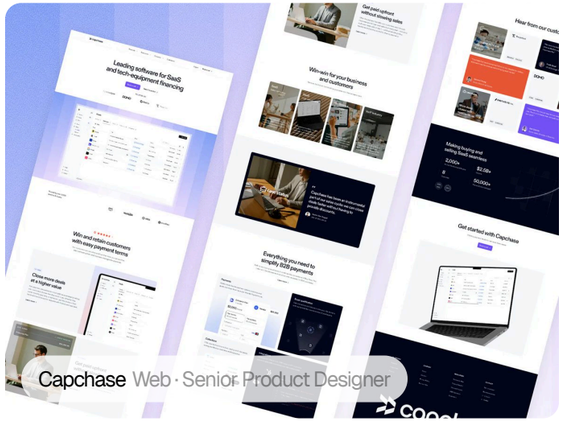

Capchase Web · Senior Product Designer



Coca-Cola App de personalización

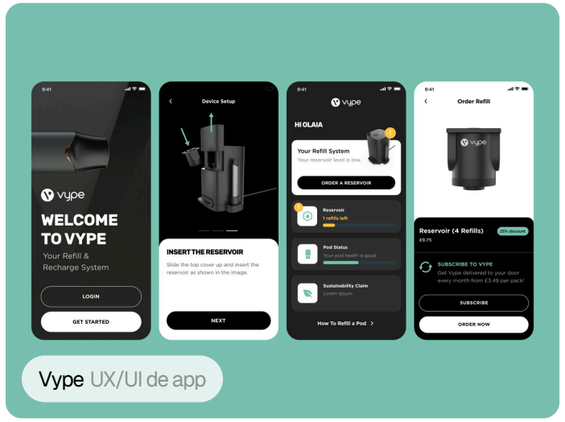

Vype UX/UI de app

(008)

Condiciones y siguientes pasos

Cualquier cambio de alcance se presupuesta y se acuerda antes de llevarse a cabo.

Incluye

- Todo lo descrito en entregables y releases.
- Dos rondas de revisión en cada uno de los diez hitos.
- Textos desarrollados conjuntamente con el equipo de dirección.
- 30 días de corrección de incidencias tras cada release.
- Archivos finales y cesión de derechos de uso, una vez completado el pago.

Costes aparte

- Licencias tipográficas y bancos de imagen.
- Plan de Framer, dominio y hosting.
- CRM e integraciones de pago.
- Producción de foto y vídeo.
- Mantenimiento posterior (opcional).

Fuera de alcance

- Una nueva dirección conceptual una vez elegida la ruta.
- Plantillas únicas o piezas por encima de lo acordado.
- Diseño de producción de las piezas mostradas como mockup: textil, papelería o editorial.
- Versiones en otros idiomas.
- Carga de contenidos adicional a la inicial acordada.

01

Revisión conjunta

Revisión de la propuesta con el equipo de dirección para ajustar alcance y releases.

02

Confirmación

Aprobación por email y emisión de la factura inicial.

03

Material de partida

Envío de la estrategia, exploraciones previas, CRM y accesos necesarios.

04

Arranque · 2 nov

Sesión de inicio para definir criterios y prioridades.

(009)

Inversión

Precio cerrado por bloque para el alcance descrito. Importes en euros, IVA no incluido.

Inversión total

7.950 € + IVA

Brand Incluye el brandbook interactivo · 11 dic	3.320 €
Website · Release 1 Publicación el 11 de enero	2.940 €
Website · Release 2 Finales de febrero	1.690 €

Forma de pago

Cada bloque se factura en dos partes: una al inicio y otra a la entrega. El reparto exacto se acordará en función de los bloques contratados.

Propuesta válida durante 30 días, hasta el 25 de noviembre de 2026.

Hablemos

olaiairigoien@gmail.com
