








Propuesta · Identidad visual y web

Una marca y una web, construidas en paralelo



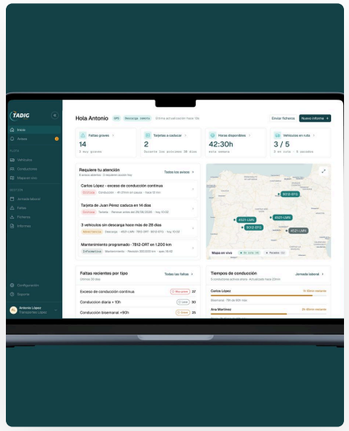





Evolucionar lo construido. Consolidar un sistema.

Propuesta de identidad visual y sitio web para una empresa industrial B2B: objetivos, entregables, calendario, equipo e inversión.

(001) Objetivos

(002) Qué construimos

(003) Lanzamientos

(004) Calendario

(005) Colaboración

(006) Experiencia

(007) Inversión

(008) Condiciones

(001)

Qué queremos conseguir

Que la marca y la web trabajen juntas para transmitir la solidez de la empresa, explicar con claridad lo que ofrece y facilitar que un cliente potencial dé el paso de contactar.

01

Una marca coherente y fácil de aplicar

Un sistema visual que conserve lo que funciona y dé criterios claros al equipo y a sus proveedores.

02

Una oferta más fácil de entender

Una web que ayude a cada audiencia a encontrar las soluciones y la información que necesita.

03

Un camino claro hacia el contacto

Formularios de contacto y cotización conectados con el proceso comercial.

Cómo lo abordamos

Desde la estrategia existente

El trabajo parte de la estrategia y la dirección visual ya definidas, con **criterios acordados en el arranque** para que cada decisión responda al negocio.

Publicación en dos etapas

El 11 de enero, **la web comercial**: la base corporativa y comercial, con los formularios conectados al CRM para empezar a recibir consultas. A finales de febrero, **contenidos y recursos**: ampliación de servicios y productos, blog y área de recursos.

Marca y web en paralelo

Con logotipo, tipografía y color aprobados comienza el diseño web, que sirve además para **validar la marca en páginas reales**.

(002)

Qué vamos a construir

Cada entregable con su alcance y formato. Despliega cada uno para ver el detalle.

Identidad visual. Un sistema para que la marca se reconozca y se aplique con coherencia en todos sus puntos de contacto.

01 **Rutas visuales**

3 rutas · 2 rondas

Tres rutas sobre el camino elegido, con foco tipográfico y el razonamiento de cada una frente a los criterios del brief.

Una dirección conceptual nueva tras elegir ruta supone revisar el alcance.

02 **Logotipo y versiones**

Principal, secundaria y símbolo

Composiciones, jerarquías, proporciones, área de protección, tamaños mínimos y usos sobre distintos fondos. Incluye la documentación técnica de construcción: retícula, curvas y geometría.

SVG, PNG, PDF y EPS.

03 **Sistema tipográfico**

Familias, pesos y jerarquías

Reglas de uso para aplicaciones y web.

Se identifican las licencias necesarias; su coste va aparte.

04 **Iconografía**

24 iconos base

Estilo, colección base y reglas para ampliar el sistema.

SVG.

05 **Sistema de color**

HEX · RGB · CMYK

Paleta principal y secundaria, combinaciones y criterios de contraste para digital e impreso.

06 **Elementos gráficos**

Editables

Formas, patrones y recursos con reglas de composición.

Identidad visual · continuación

07

Estilo de foto y vídeo

Dirección visual

Referencias, encuadres, ritmo, tratamiento de color y criterios de selección y producción.

La producción de foto y vídeo se presupuesta aparte.

08

Aplicaciones listas para usar

Piezas editables para el día a día

Aplicaciones prioritarias que el equipo podrá usar desde el primer momento, seleccionadas en el arranque. Entre ellas, la firma de email, implementable y probada en los principales gestores de correo, y la portada y foto de perfil de LinkedIn.

Incluye una ronda adicional de ajustes en la firma tras su implantación.

09

Mockups de aplicación

6 escenas sectoriales

Representaciones de la identidad aplicada a contextos propios de la industria del cliente, como embalaje de transporte o señalética de planta. Se seleccionan en el arranque.

Los mockups muestran el comportamiento de la marca y no constituyen diseños de producción. Piezas como una línea textil, papelería o publicaciones editoriales requieren un proceso de diseño específico y se presupuestan aparte.

10

Plantilla de presentación

PowerPoint · estructura + ejemplos

Portada, contraportada, separadores y páginas internas, más diapositivas de ejemplo con contenido real: gráficos, tablas y datos. Las tipologías de contenido se definen conjuntamente con el equipo de dirección.

Compatible con Google Slides y Keynote.

11

Brandbook interactivo

Brand site + PDF

La referencia única para aplicar la marca con coherencia, pensada para el equipo interno y sus proveedores. Documenta todo el sistema: logotipo y variantes, construcción técnica, tipografía, color, elementos gráficos, fotografía y aplicaciones, con ejemplos de uso correcto e incorrecto. Incluye guías navegables, descarga directa de recursos y versión en PDF.

Incluye diseño, construcción y configuración. El plan de la plataforma es un coste recurrente del cliente.

12

Archivos y recursos de marca

Nomenclatura + traspaso

Editables y exportaciones organizados: logotipos, colores, tipografías y licencias.

Sesión de traspaso de una hora con el equipo.

Diseño y desarrollo web

Una web que ordene la oferta, facilite las consultas comerciales y permita al equipo actualizar los contenidos.

01

Arquitectura y UX/UI

~12 plantillas · 3 tamaños

Revisión de la arquitectura y los contenidos actuales con el cliente: qué se mantiene, qué se modifica y qué se incorpora. Mapa del sitio, recorridos por audiencia y reparto entre lanzamientos. Exploración visual, wireframes y plantillas en escritorio, tablet y móvil.

Componentes en Figma.

02

Sistema de plantillas

Plantillas con variantes

Cada tipo de página se diseña como una plantilla modular con variantes de fondo, color y composición de módulos. Así cada página tiene identidad propia sin multiplicar diseños.

El alcance se mide en plantillas únicas, no en número de páginas.

03

Textos y contenidos

Desarrollo conjunto con dirección

El equipo de dirección lidera la narrativa y los mensajes; desde diseño se aporta la arquitectura de contenidos, titulares, microcopy y su ajuste al diseño.

El diseño se trabaja siempre con contenido real.

04

Desarrollo y gestión de contenidos

Framer

Colecciones del CMS (oferta, fichas y blog), carga inicial acordada, acceso y formación.

05

Formularios y CRM

Contacto + Request a Quote

Campos, adjuntos, validaciones, confirmaciones, destino, asignación y seguimiento. Flujo probado de principio a fin.

Integración directa o vía Make/Zapier según el CRM; suscripciones aparte.

06

Pruebas y publicación

HTTPS en su dominio

Navegación, formularios, responsive, accesibilidad básica, rendimiento, SEO técnico básico y medición. Coordinación de DNS y hosting.

07

Plataforma

Framer recomendado

Permite publicar con agilidad, ofrece un CMS sencillo para el equipo y garantiza una gran fidelidad a la marca.

El límite del CMS depende del plan y los formularios llegan al CRM por integración.

08

Formación y soporte tras el lanzamiento

30 días por lanzamiento

Accesos, documentación, guía de uso y formación, con corrección de incidencias tras cada lanzamiento.

Mantenimiento posterior opcional, como bolsa de horas.

(003)

Qué publicaremos en cada etapa

Una web corporativa y comercial para presentar la empresa, explicar sus servicios y productos, y facilitar las solicitudes de presupuesto. Primero se publica la base comercial; después, la ampliación de contenidos y recursos.

Primer lanzamiento · 11 de enero

La web comercial

La base corporativa y comercial, con los formularios conectados al CRM para empezar a recibir consultas.

Home	Empresa, servicios y productos destacados, elementos de confianza y accesos principales.
About us	Información corporativa y presentación de la empresa.
Servicios	Presentación y una selección inicial de páginas de detalle.
Productos	Entrada al catálogo y una selección inicial de categorías y fichas.
Contacto	Información y formulario de consultas generales.
Request a Quote	Formulario de presupuesto, accesible desde la navegación y las páginas comerciales.
Navegación y footer	Accesos principales, certificaciones, redes y legales.

Segundo lanzamiento · finales de febrero

Contenidos y recursos

Ampliación de las secciones previstas en el alcance e incorporación de blog y recursos.

Ajustes	Cambios acordados sobre el primer lanzamiento.
About us	Experiencia, instalaciones y otros contenidos de presentación.
Servicios y productos	Resto de páginas de detalle, categorías y fichas previstas.
Blog / News	Listado de publicaciones y páginas de artículo.
Recursos	Catálogos, documentación técnica, certificaciones y descargables.

Estructura orientativa




Los nombres de las secciones, su organización y su distribución entre lanzamientos se validarán al inicio del proyecto, una vez revisados la oferta y los contenidos de la empresa. Las páginas de un mismo tipo comparten una plantilla con variantes de contenido y composición: por ejemplo, las categorías de producto usan una plantilla común y las fichas, otra. Cualquier ampliación de plantillas, funcionalidades o carga de contenidos se valorará y acordará previamente.

(004)

Calendario

Inicio el 2 de noviembre. En Navidad, el trabajo se detiene únicamente en los días festivos.

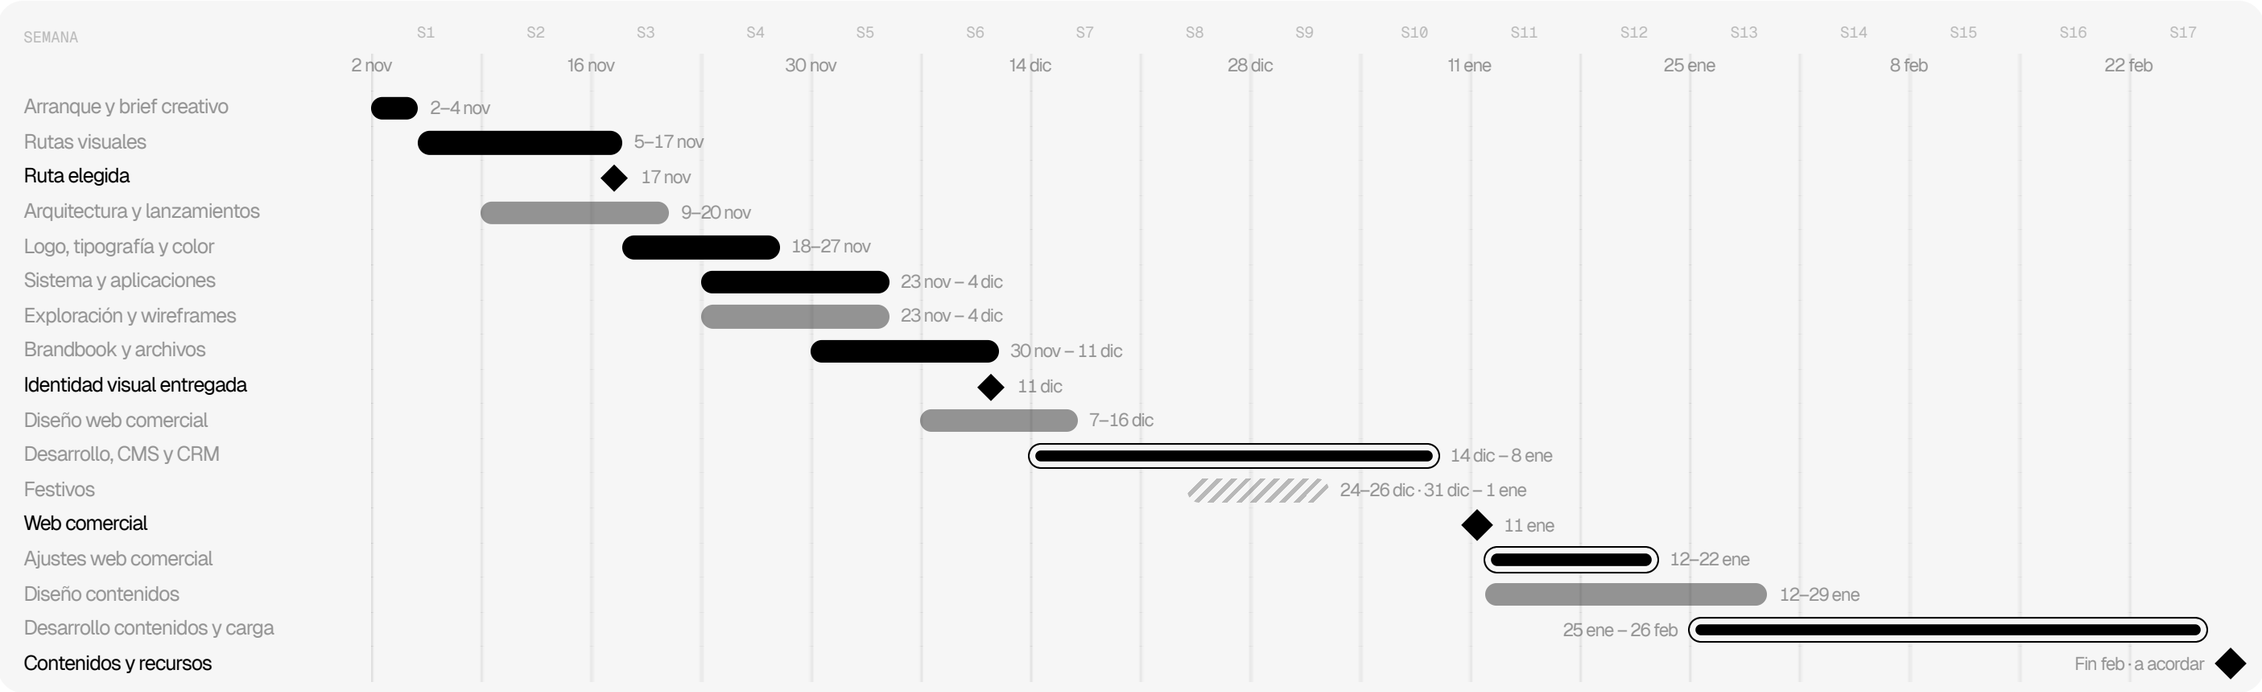

17 nov

Elección de la ruta visual, tras su presentación el día 12.

27 nov

Logo, tipografía y color aprobados.

11 dic

Identidad visual entregada.

11 ene

Web comercial publicada.

Fin feb

Contenidos y recursos publicados. Fecha a acordar.

Las fechas asumen que cada fase se valida en 2–3 días hábiles, con el feedback consolidado en un único documento, y que los textos de cada lanzamiento se entregan según lo previsto. Si los plazos de validación se amplían, el calendario se reajustará de mutuo acuerdo.

(005)

Cómo trabajaremos

Un equipo reducido, con marca y web avanzando en paralelo y validaciones claras en cada fase.

Diseño de marca y web

Esamesa Studio

Dirección visual de marca y web, desde las primeras rutas hasta el desarrollo en Framer. Un único interlocutor para todo el diseño, responsable de presentar cada hito.

Estrategia

Equipo de dirección

Estrategia, prioridades, narrativa y textos, y relación directa con el cliente.

Marca	Rutas y logo	Sistema	Aplicaciones	Brandbook
Web	Arquitectura	Wireframes	Web comercial	Contenidos
Estrategia	Brief y criterios	Revisión	Textos comerciales	Textos de recursos

Sesión semanal

Seguimiento y planificación con todo el equipo para anticipar bloqueos. No sustituye ni suma rondas de revisión.

Decisiones fundamentadas

Cada propuesta explica cómo responde a la marca, al negocio y a sus audiencias.

Idiomas y archivos

Coordinación en español; materiales de marca y web en inglés. Todo el trabajo en Figma, con acceso desde el primer día.

Revisiones acotadas

Fases creativas (rutas, logo y sistema, exploración y diseño web): dos rondas de ajustes, con el feedback consolidado en un único documento. Validaciones técnicas y entregas (brandbook, publicación de cada lanzamiento): comprobaciones y corrección de incidencias. Cada fase aprobada se da por cerrada.

Uso responsable de la IA

Como apoyo para explorar y agilizar procesos; los resultados siempre se trabajan hasta convertirlos en un lenguaje propio.

(006)

Experiencia relevante

Diseñadora senior de producto y marca, y cofundadora de Esamesa Studio.

Especialidades

01 Product Design
02 B2B SaaS
03 UX/UI
04 Design Systems
05 Brand & Web
06 Diseño gráfico
07 No-code
08 Flujos creativos con IA

Identidad, producto digital y web. Pulsa sobre una imagen para ampliarla.

Experiencia

Esamesa Studio — 2025 – hoy
Diseñadora de producto freelance y cofundadora

Mitimiti Studio — 2026 – hoy
Freelance Senior Product Designer

Capchase — 2021 – 2025
Senior Product Designer


Propelland — 2018 – 2021
Product Designer

Docencia — 2017 – 2019
Ironhack (UX/UI) y Creanavarra (Design Marketing)


Especialidades

Coca-Cola
Capchase
Indra
Baleària
TADIG
Colectin
Jackrom
Vype
Emotionhack
EdgeIQ
Xendra
Mailuna


Trabajo seleccionado




Colectin Identidad visual




TADIG Rediseño UX/UI y design system



Baleària UX/UI de app




Jackrom Diseño web y dirección visual



Capchase Web · Senior Product Designer



Coca-Cola App de personalización

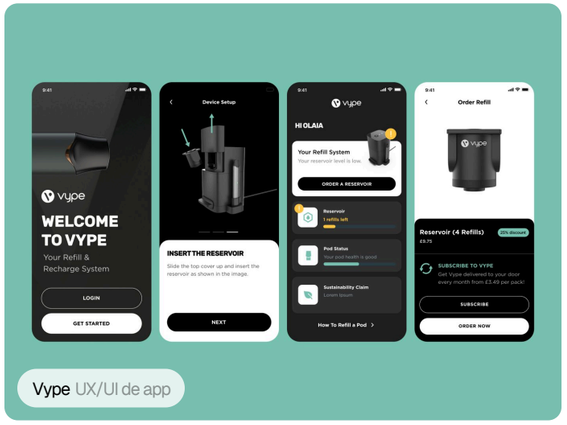

Vype UX/UI de app



Indra Campaña de captación

(007)

Inversión

Precio cerrado por bloque para el alcance descrito. Importes en euros, IVA no incluido.

Inversión total

8.110 € + IVA

Identidad visual Incluye el brandbook interactivo · 11 dic	3.480 €
Web comercial Primer lanzamiento · 11 de enero	2.940 €
Contenidos y recursos Segundo lanzamiento · finales de febrero	1.690 €

Forma de pago

Cada bloque se factura en dos partes: una al inicio y otra a la entrega. El reparto exacto se acordará en función de los bloques contratados.

Propuesta válida durante 30 días, hasta el 25 de noviembre de 2026.

(008)

Condiciones y próximos pasos

Cualquier cambio de alcance se presupuesta y se acuerda antes de llevarse a cabo.

Incluye

- Todo lo descrito en entregables y lanzamientos.
- Dos rondas de ajustes en cada fase creativa.
- Comprobaciones y corrección de incidencias en validaciones técnicas y entregas.
- Textos desarrollados conjuntamente con el equipo de dirección.
- 30 días de corrección de incidencias tras cada lanzamiento.
- Archivos finales y cesión de derechos de uso, una vez completado el pago.

Costes aparte

- Licencias tipográficas y bancos de imagen.
- Plan de Framer, dominio y hosting.
- CRM e integraciones de pago.
- Producción de foto y vídeo.
- Mantenimiento posterior (opcional).

Fuera de alcance

- Reabrir fases ya aprobadas o rondas adicionales.
- Una nueva dirección conceptual una vez elegida la ruta.
- Plantillas únicas o piezas por encima de lo acordado.
- Diseño de producción de las piezas mostradas como mockup: textil, papelería o editorial.
- Versiones en otros idiomas.
- Carga de contenidos adicional a la inicial acordada.

01

Revisión conjunta

Revisión de la propuesta con el equipo de dirección para ajustar alcance y lanzamientos.

02

Confirmación

Aprobación por email y emisión de la factura inicial.

03

Material de partida

Envío de la estrategia, exploraciones previas, CRM y accesos necesarios.

04

Arranque · 2 nov

Sesión de inicio para definir criterios y prioridades.

Hablemos

olaiairigoien@gmail.com
